ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Workshop #3 – Ingeniería de Software I


Integrantes

- Luis Daniel Flores Feijoó
- Enrique Haziel Barco Manobanda
- Roy Eliecer García Erazo
- María de Lourdes Durango Tumbaco

1. Tablero ágil

Para el proyecto ContaImp usamos Asana. La elegimos porque permite organizar el trabajo en secciones por sprint, asignar tareas con fecha a cada integrante y ver el avance en una vista de tablero. Su desventaja es que la cuenta gratuita no permite un enlace abierto sin invitar a las personas por correo electrónico.

El Scrum Master creó el proyecto y agregó a los demás integrantes. El tablero tiene una sección por sprint (de Sprint 0 a Sprint 5). Cada tarea lleva entre corchetes el nombre de quien la hace.

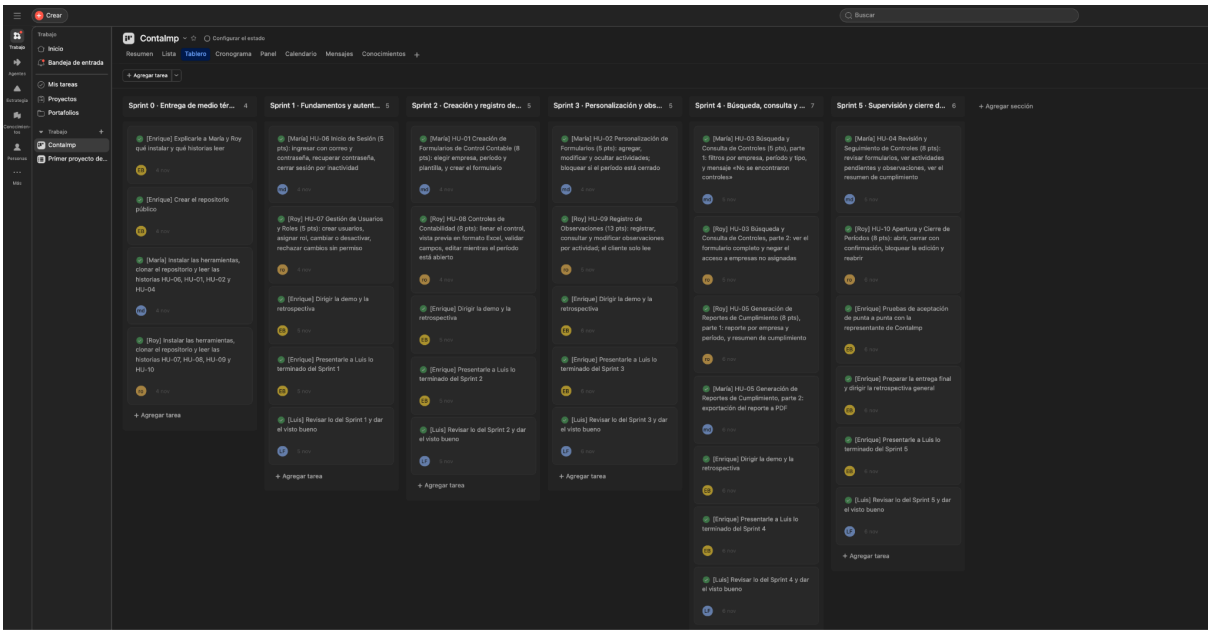

2. Historias en el backlog

El backlog tiene 10 historias de usuario. La historia HU-05 (Generación de Reportes de Cumplimiento) tiene prioridad Could Have y entra en el Sprint 4 junto con HU-03.


ID	Historia
HU-06	Inicio de Sesión
HU-07	Gestión de Usuarios y Roles

ID	Historia
HU-01	Creación de Formularios de Control Contable
HU-08	Controles de Contabilidad
HU-02	Personalización de Formularios
HU-09	Registro de Observaciones
HU-03	Búsqueda y Consulta de Controles
HU-05	Generación de Reportes de Cumplimiento
HU-04	Revisión y Seguimiento de Controles
HU-10	Apertura y Cierre de Períodos

3. Estimación con Planning Poker

Estimamos las historias de usuario con Planning Poker en planningpokeronline.com. Cada integrante votó con la escala 1, 2, 3, 5, 8 y 13; se compararon los votos y se discutieron las diferencias hasta llegar a un acuerdo. Los puntos miden el esfuerzo relativo, no las horas.

Historia	Estimación (puntos)
HU-06 Inicio de Sesión	5
HU-07 Gestión de Usuarios y Roles	5
HU-01 Creación de Formularios de Control Contable	8
HU-08 Controles de Contabilidad	8
HU-02 Personalización de Formularios	5
HU-09 Registro de Observaciones	13
HU-03 Búsqueda y Consulta de Controles	5
HU-05 Generación de Reportes de Cumplimiento	8
HU-04 Revisión y Seguimiento de Controles	8
HU-10 Apertura y Cierre de Períodos	8
Total del backlog	73

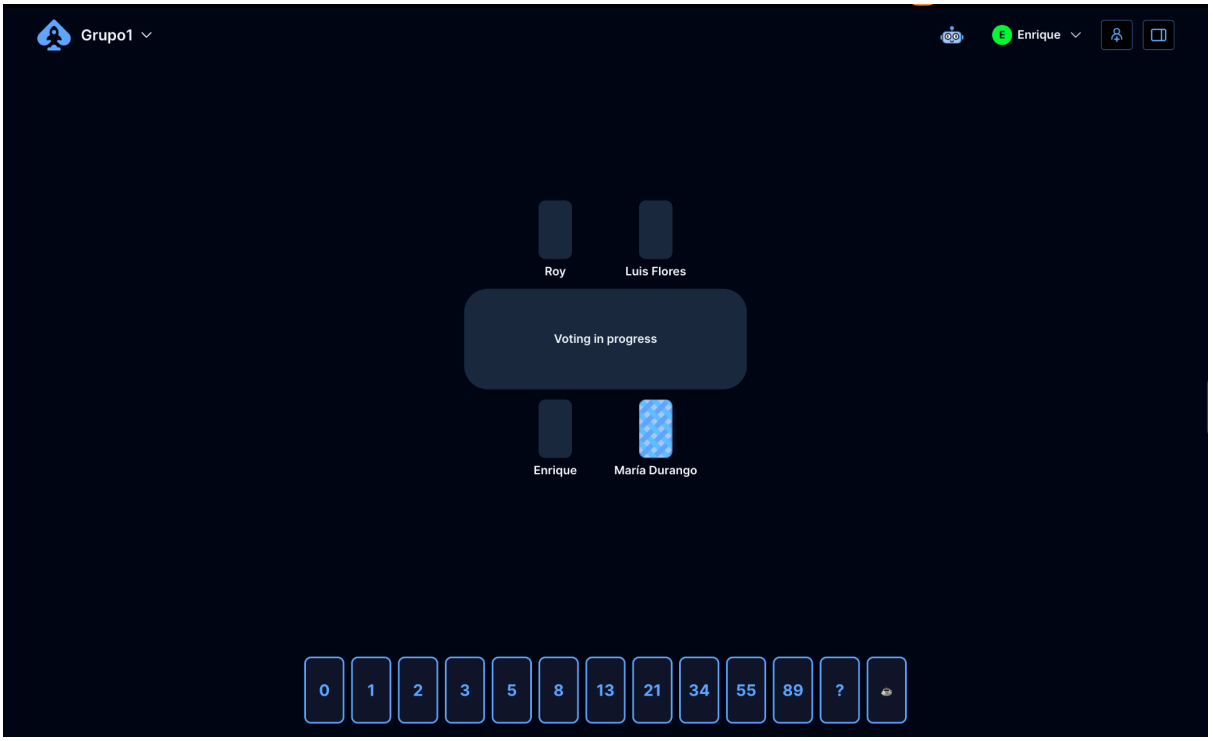

4. Velocidad del equipo

Para calcular la velocidad, simulamos que el equipo ya ha completado tres sprints. Tomamos como esos tres sprints los primeros del plan del proyecto.

Sprint	Historias completadas	Total de puntos
1	HU-06, HU-07	10
2	HU-01, HU-08	16
3	HU-02, HU-09	18

Velocidad promedio = (10 + 16 + 18) / 3 = 44 / 3 = 14,7 puntos por sprint.

5. Número de sprints necesarios

Número de sprints = total de puntos del backlog / velocidad promedio = 73 / 14,7 = 5,0.
Redondeamos hacia arriba, por lo que el equipo necesita 5 sprints.

Sprint	Historias asignadas	Puntos estimados
1	HU-06, HU-07	10
2	HU-01, HU-08	16
3	HU-02, HU-09	18
4	HU-03, HU-05	13


Sprint	Historias asignadas	Puntos estimados
5	HU-04, HU-10	16
Total		73

Los sprints 2, 3 y 5 superan el promedio porque las historias se agrupan por dependencia: primero, el inicio de sesión y los usuarios; luego, los formularios. El sprint 4, con 13 puntos, queda cerca del promedio. Las historias ya están ordenadas en las secciones del tablero de sprint.

6. Burndown Chart

Sprint	Puntos restantes
0	73
1	63
2	47
3	29
4	16
5	0

El gráfico está en la hoja de cálculo del taller, en la pestaña Burndown.

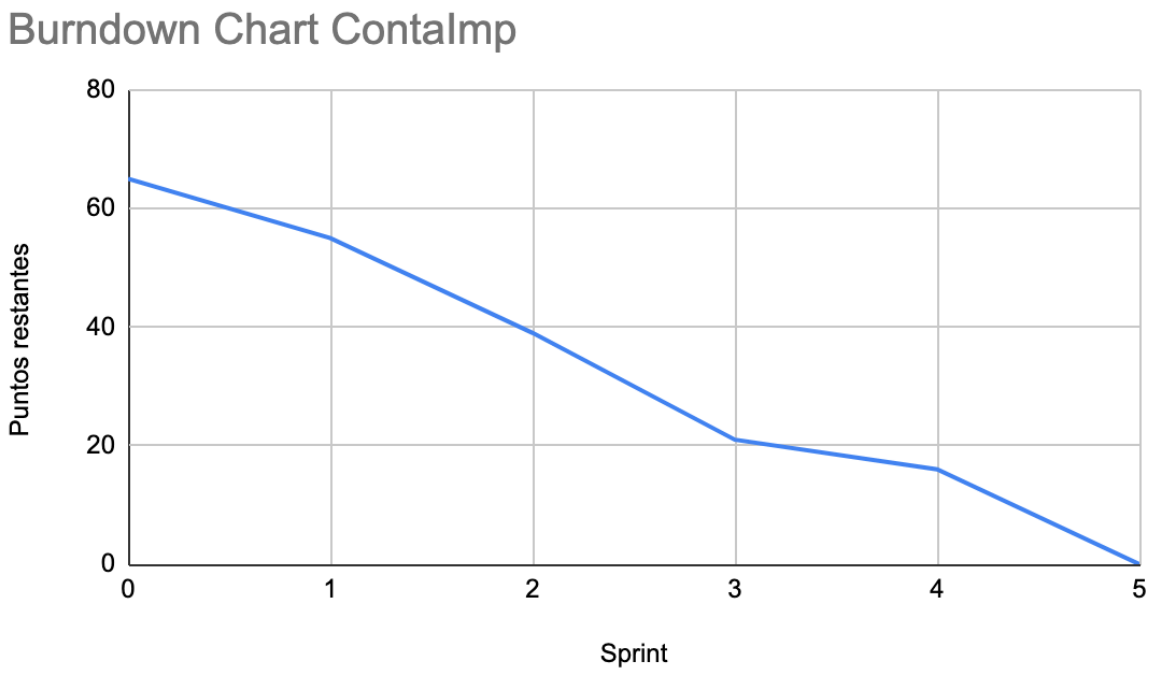

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1giNVF3wzFhfvewWdO6syHfl1lruBDaRaUrpBVYYN5Ow/edit?usp=sharing

7. Reflexión final

¿Qué técnica fue más útil para estimar el esfuerzo?

Planning Poker. Votar todos al mismo tiempo evitó que una opinión arrastrara a las demás, y las diferencias entre los votos mostraron que las historias no estaban claras. Por ejemplo, el registro de observaciones (HU-09) fue la historia más grande, con 13 puntos, porque abarca varios casos de uso en una sola historia.

¿La velocidad ayuda realmente a planificar? ¿Por qué?

Sí, porque convierte los puntos en una cantidad de sprints y nos obliga a repartir el trabajo dentro de un límite. Con 73 puntos y una velocidad de 14,7 salieron 5 sprints. Pero esta velocidad es una simulación y no un dato medido, así que hay que tomarla como una guía. Se vuelve confiable cuando se mide con sprints reales.

¿Qué mejoraríamos en este proceso?

Mediremos la velocidad con los primeros sprints reales y ajustaremos el plan en función de ese dato. También dividiremos HU-09 en historias más pequeñas y distribuiremos mejor los puntos para que ningún sprint se desvíe demasiado del promedio.

8. Enlace al tablero de trabajo

https://app.asana.com/1/1219878129769925/project/1220228279089132/board/1220228279089147
